


蒲田西地区「都区合同庁舎」整備計画の延期について

1 整備計画

蒲田西地区の公共施設の整備に当たっては、「大田区公共施設等総合管理計画」に基づき、効果的・効率的な施設マネジメントによる区民サービスの維持・向上を実現するため、東京都と連携し、蒲田西特別出張所・地域包括支援センター等と大田都税事務所からなる「都区合同庁舎」の整備を進めている。

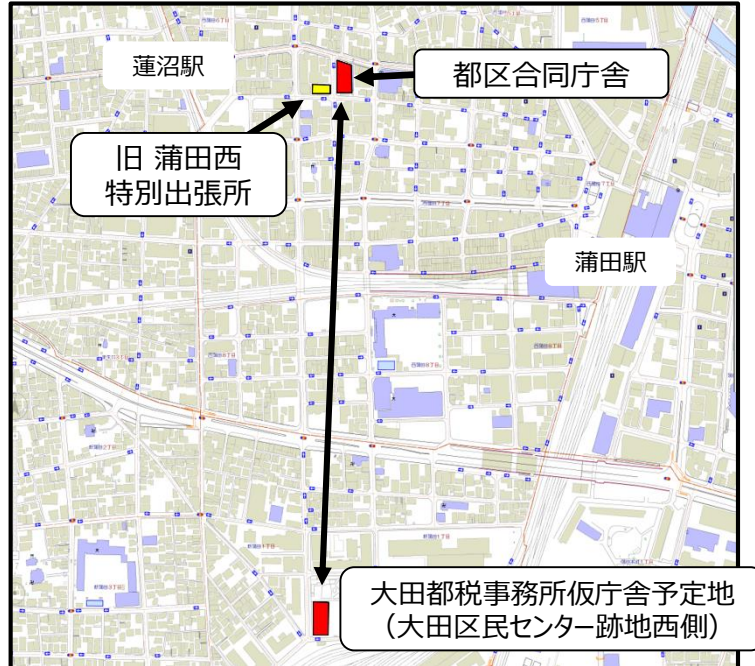

2 変更理由

東京都から、「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度は事業を実施せず、来年度に延期する予定である」旨の通知があったため、以下のスケジュールで対応する。

3 スケジュール

(1) 変更前スケジュール (青の塗りつぶし：東京都の通知を受け、変更される工程)

年度	H30	H31 (R1)	H32 (R2)	H33 (R3)	H34 (R4)	H35 (R5)	H36 (R6)	H37 (R7)	H38 (R8)
旧蒲田西特別出張所	基本計画	実施設計	長寿命化工事	蒲田西特別出張所				改修工事	蒲田西地区地域活動拠点
都区合同庁舎	移転	基本設計	実施設計	解体工事	(都区合同庁舎) 建設工事		都区合同庁舎		
	蒲田西特別出張所		(参考) 大田都税事務所仮庁舎						

(2) 変更後スケジュール (赤の塗りつぶし：東京都の通知を受け、変更する工程)

年度	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
旧蒲田西特別出張所	基本計画	実施設計	長寿命化工事	蒲田西特別出張所				改修工事	蒲田西地区地域活動拠点
都区合同庁舎	移転	基本設計	実施設計	解体工事	(都区合同庁舎) 建設工事		都区合同庁舎		
	蒲田西特別出張所		(参考) 大田都税事務所仮庁舎						

※ スケジュールについては、今後の社会情勢を踏まえ変更となる場合がある。
